


ヒカリ 3WAY パネル設置工法

特許出願中

2019年6月17日の発電状況レポート

1. 発電所情報		2. 発電状況レポート		今月発電量	6441.00 kWh
発電所ID	5366	日付	2019年6月17日	今月売電金額	125.213円
発電所名	五主町低圧	1日発電量	568.00 kw	売電金額	11.042円
発電所出力	124.2 kw				

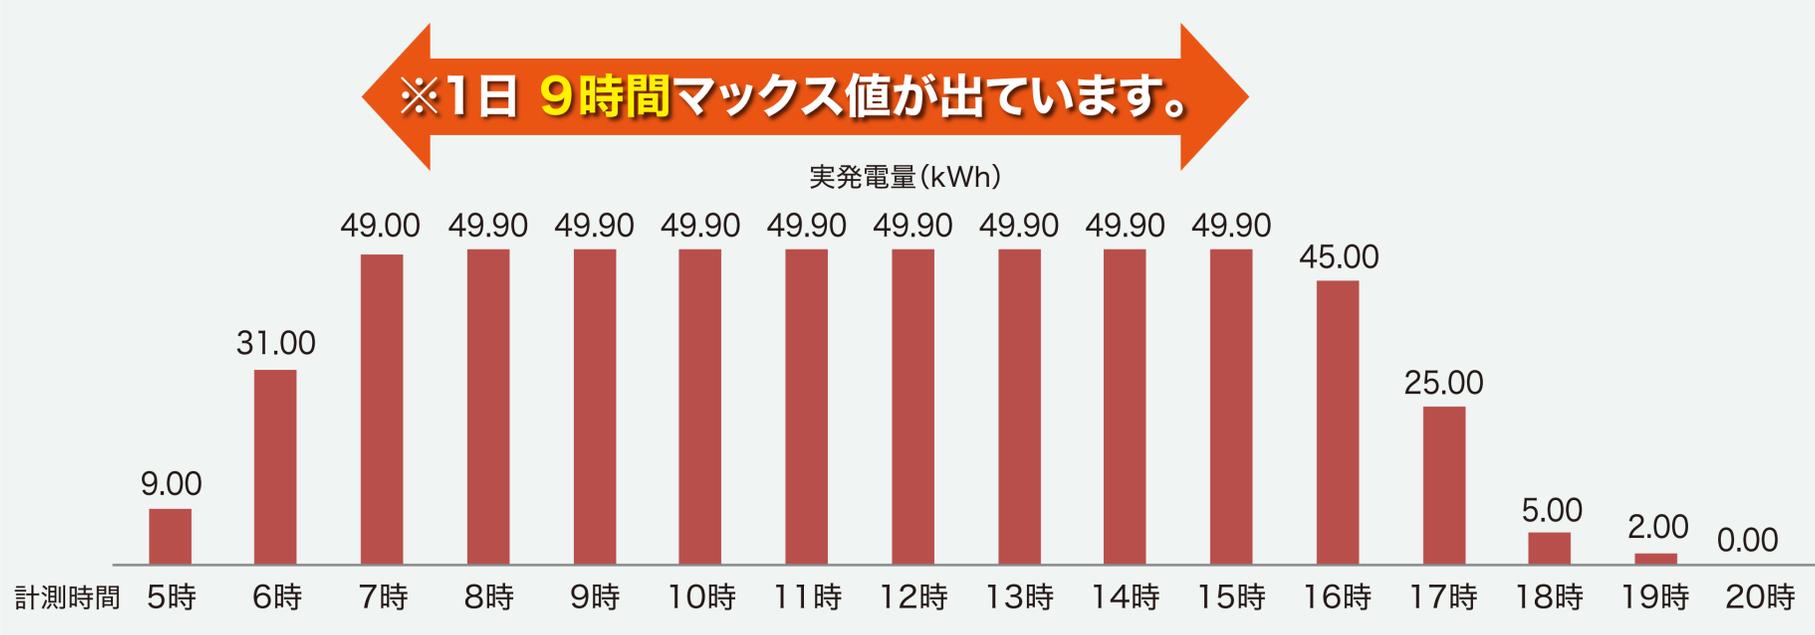

ストリング状況レポート

計測時間	PCS1	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	合計電流値
①南向	ストリング1電流	0.66	3.25	3.48	2.80	3.78	3.68	3.69	3.68	3.93	3.96	3.92	3.27	1.15	0.35	41.57
	ストリング2電流	0.66	2.40	1.93	2.92	3.64	3.53	3.51	3.73	3.77	3.93	3.91	3.28	1.17	0.36	38.70
	ストリング3電流	0.66	3.24	4.18	3.91	3.34	3.40	3.43	3.26	3.46	3.62	3.84	3.27	1.15	0.35	41.06
	①小計	1.98	8.89	9.58	9.62	10.76	10.61	10.62	10.66	11.16	11.51	11.66	9.81	3.46	1.05	121.33
①東向	ストリング4電流	1.09	5.79	5.70	4.44	3.42	3.30	3.20	3.26	3.08	2.68	2.24	0.92	0.19	0.00	39.29
	ストリング5電流	0.99	5.66	5.51	4.37	3.35	3.36	3.25	3.08	3.04	2.64	2.22	0.91	0.18	0.00	38.52
	ストリング6電流	1.13	5.80	5.76	4.78	3.88	3.69	3.67	3.12	3.14	2.62	2.23	0.92	0.19	0.00	40.90
	②小計	3.20	17.25	16.96	13.58	10.64	10.35	10.11	9.46	9.26	7.93	6.68	2.75	0.55	0.00	118.70
①西向	ストリング7電流	0.76	1.32	2.45	2.89	3.30	3.48	3.47	3.52	3.70	4.05	5.19	5.86	3.51	1.94	45.39
	ストリング8電流	0.60	1.24	2.37	2.89	3.37	3.61	3.52	3.50	3.84	4.18	5.18	5.90	2.20	0.21	42.58
	ストリング9電流	0.66	1.25	2.40	2.93	3.46	3.43	3.50	3.55	3.80	4.47	5.25	5.84	3.46	1.85	45.83
	③小計	2.01	3.81	7.22	8.71	10.12	10.51	10.49	10.56	11.33	12.69	15.62	17.60	9.16	4.00	133.79
合計①+②+③	7.19	29.94	33.76	31.91	31.52	31.46	31.21	30.68	31.75	32.13	33.96	30.15	13.16	5.04	373.82	3分の1
①×3倍	5.94	26.66	28.74	28.86	32.27	31.82	31.85	31.97	33.48	34.52	34.98	29.42	10.37	3.14	363.98	全南向

※全南向き架台よりも3分の1架台が上回っている ▶ 9.84

